


1. SUMÁRIO EXECUTIVO

PROGRESSO PLANEJADO (POND.) 17.57 % Meta acumulada até 12/05/2026	PROGRESSO EXECUTADO (POND.) 16.27 % Avanço físico acumulado	DESVIO DE PROGRESSO -1.30 % Executado – Planejado	SITUAÇÃO GERAL DA OBRA Atenção
--	--	--	---

2. CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

PLANEJADO		17.6%
EXECUTADO		16.3%

3. CURVA S — HISTÓRICO DE AVANÇO FÍSICO

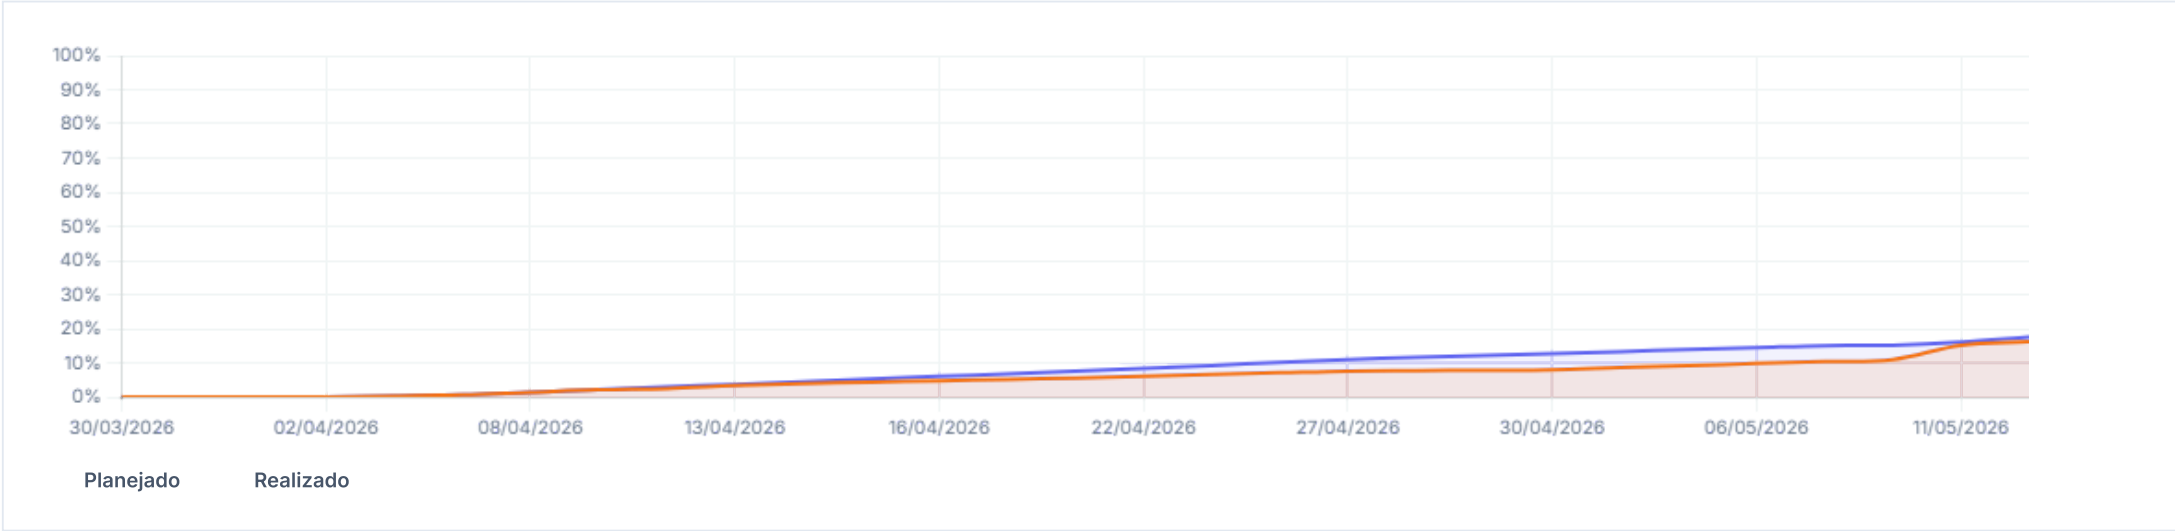

4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS POR STATUS

0 CRÍTICO	0 EM ALERTA	2 AO PLANO	4 NÃO INICIADO	7 AGUARDANDO	2 CONCLUÍDO
--------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------

5. DETALHAMENTO POR SERVIÇO

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Mobilização e Instalação do Canteiro Produção: 1,00 / 1,00 (Falta: 0,00) UN	5.0%	06/04/2026	15 d.u.	27/04/2026	✓	100.00%	100.00%	+0.00%	● CONCLUÍDO
Terraplenagem e Drenagem Aguarda: Mobilização e Instalação do Canteiro (100.0%) Produção: 5.000,00 / 5.000,00 (Falta: 0,00) M3	10.0%	08/04/2026	20 d.u.	07/05/2026	✓	100.00%	100.00%	+0.00%	● CONCLUÍDO
Construção da Casa de Comando Aguarda: Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 27,50 / 100,00 (Falta: 72,50) M2	5.0%	23/04/2026	40 d.u.	19/06/2026	27 d	32.50%	27.50%	-5.00%	● AO PLANO Prev. ritmo atual: 30/06/2026 (+8d úteis)
1.8.2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO Produção: 0,00 / 63,00 (Falta: 63,00) M3	0.0%	11/05/2026	30 d.u.	22/06/2026	28 d	6.67%	0.00%	-6.67%	● AO PLANO
PISO EXEMPLO Aguarda: Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 15,00 / 100,00 (Falta: 85,00) m²	8.0%	11/05/2026	10 d.u.	22/05/2026	8 d	20.00%	15.00%	-5.00%	🕒 AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS Prev. ritmo atual: 27/05/2026 (+4d úteis)

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Montagem de Estruturas Metálicas Aguarda: Fundações (Pórticos e Equipamentos) (0.0%) Produção: 0,00 / 50,00 (Falta: 50,00) TON	15.0%	12/05/2026	20 d.u.	09/06/2026	19 d	5.00%	0.00%	-5.00%	AGUARDANDO: FUNDAÇÕES (PÓRTICOS E EQUIPAMENTOS)
Fundações (Pórticos e Equipamentos) Aguarda: Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 150,00 (Falta: 150,00) M3	5.0%	18/05/2026	25 d.u.	22/06/2026	—	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Montagem do Transformador de Força Aguarda: Malha de Aterramento (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) UN	10.0%	27/05/2026	10 d.u.	10/06/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MALHA DE ATERRAMENTO
Malha de Aterramento Aguarda: Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 2.000,00 (Falta: 2.000,00) M	10.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	—	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Montagem de Disjuntores e Chaves Aguarda: Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 10,00 (Falta: 10,00) UN	5.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	—	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Sistemas Auxiliares (Baterias/Painéis CC-CA) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) CJ	5.0%	22/06/2026	10 d.u.	03/07/2026	—	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Painéis de Proteção e Controle (SPCS) Aguarda: Construção da Casa de Comando (27.5%) Produção: 0,00 / 5,00 (Falta: 5,00) UN	10.0%	27/06/2026	15 d.u.	17/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
Comissionamento e Ensaios Aguarda: Montagem de Disjuntores e Chaves (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	8.0%	11/07/2026	15 d.u.	31/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE DISJUNTORES E CHAVES
Lançamento de Cabos de Força/Controle Aguarda: Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 5.000,00 (Falta: 5.000,00) M	10.0%	12/07/2026	20 d.u.	07/08/2026	20 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Energização e Operação Assistida Aguarda: Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	2.0%	26/07/2026	5 d.u.	31/07/2026	5 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

LEGENDA

Crítico — desvio negativo acima do limite configurado ou prazo esgotado Em Alerta — desvio moderado, requer monitoramento Ao Plano — dentro da meta prevista

Aguardando — bloqueado por dependência de outro serviço Não Iniciado — aguardando mobilização Concluído — progresso ≥ 99,9%

☐ Barra cinza = meta planejada | Barra colorida = executado acumulado D. Rest. = dias úteis restantes · "x ritmo" = múltiplo de aceleração necessário para recuperar o atraso

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro / Supervisor

GESTOR DA OBRA
Coordenação
