

LIVRO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS DE OBRA

Obra: SE OBRA EXEMPLO

Período Consolidado: 18/05/2026 a 20/05/2026

PROGRESSO NO PERÍODO

Avanço Inicial: 16.38% (Plan: 21.07%)

Avanço Final: **16.38%** (Plan: 23.23%)

Avanço Realizado no Período: **+0.0%**

CONDIÇÕES E EFETIVO

Clima Praticável: **3 turnos**

Clima Impraticável (Chuva): **0 turnos**

Média de Efetivo: **27.0 operários/dia**



ENGENHARIA LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

RELATÓRIO Nº 43	DATA 18/05/2026
DIA DA SEMANA Segunda-Feira	CONTRATO —
OBRA SE OBRA EXEMPLO	PRAZO CONTRATUAL 112 dias
LOCAL FORTALEZA	PRAZO DECORRIDO 43 dias
CONTRATANTE Não informado	RESPONSÁVEL Não informado
	PRAZO A VENCER 69 dias

PONTOS CRÍTICOS — 1 OCORRÊNCIA IDENTIFICADA

- Serviço 'Construção da Casa de Comando' CRÍTICO — Desvio de 15.0% excede limite de 10%


1. SUMÁRIO EXECUTIVO

PROGRESSO PLANEJADO (POND.) 21.07 % Meta acumulada até 18/05/2026	PROGRESSO EXECUTADO (POND.) 16.38 % Avanço físico acumulado	DESVIO DE PROGRESSO -4.70 % Executado – Planejado	SITUAÇÃO GERAL DA OBRA Atenção
--	--	--	--

2. CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

PLANEJADO		21.1%
EXECUTADO		16.4%

3. CURVA S — HISTÓRICO DE AVANÇO FÍSICO

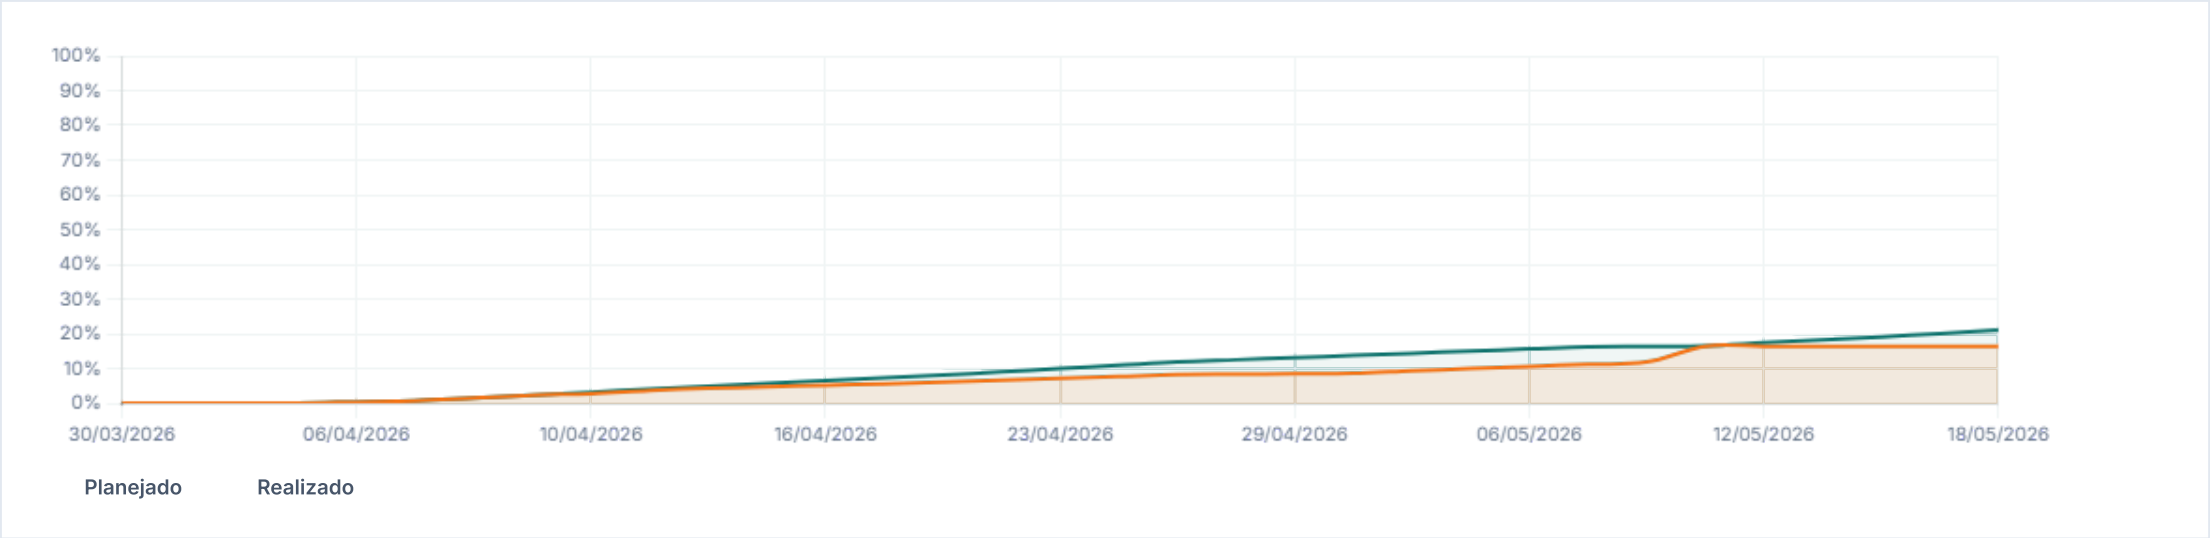

4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS POR STATUS

1 CRÍTICO	0 EM ALERTA	1 AO PLANO	3 NÃO INICIADO	6 AGUARDANDO	2 CONCLUÍDO
--------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------

5. DETALHAMENTO POR SERVIÇO

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Mobilização e Instalação do Canteiro Produção: 1,00 / 1,00 (Falta: 0,00) UN	5.0%	06/04/2026	15 d.u.	27/04/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO
Terraplenagem e Drenagem Restrição: Aguarda Mobilização e Instalação do Canteiro (100.0%) Produção: 5.000,00 / 5.000,00 (Falta: 0,00) M3	10.0%	08/04/2026	20 d.u.	07/05/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Construção da Casa de Comando Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 27,50 / 100,00 (Falta: 72,50) M2	5.0%	23/04/2026	40 d.u.	19/06/2026	23 d	42.50%	27.50%	-15.00%	CRÍTICO (Desvio -15.0% > Limite 10%) Previsão de término: 20/07/2026 (+22d úteis)
Montagem de Estruturas Metálicas Restrição: Aguarda Fundações (Pórticos e Equipamentos) (0.0%) Produção: 0,00 / 50,00 (Falta: 50,00) TON	15.0%	12/05/2026	20 d.u.	09/06/2026	15 d	25.00%	0.00%	-25.00%	AGUARDANDO: FUNDAÇÕES (PÓRTICOS E EQUIPAMENTOS)
Fundações (Pórticos e Equipamentos) Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 150,00 (Falta: 150,00) M3	5.0%	18/05/2026	25 d.u.	22/06/2026	24 d	4.00%	0.00%	-4.00%	AO PLANO
Montagem do Transformador de Força Restrição: Aguarda Malha de Aterramento (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) UN	10.0%	27/05/2026	10 d.u.	10/06/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MALHA DE ATERRAMENTO
Malha de Aterramento Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 2.000,00 (Falta: 2.000,00) M	10.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Montagem de Disjuntores e Chaves Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 10,00 (Falta: 10,00) UN	5.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Sistemas Auxiliares (Baterias/Painéis CC-CA) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) CJ	5.0%	22/06/2026	10 d.u.	03/07/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Painéis de Proteção e Controle (SPCS) Restrição: Aguarda Construção da Casa de Comando (27.5%) Produção: 0,00 / 5,00 (Falta: 5,00) UN	10.0%	27/06/2026	15 d.u.	17/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
Comissionamento e Ensaios Restrição: Aguarda Montagem de Disjuntores e Chaves (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	8.0%	11/07/2026	15 d.u.	31/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE DISJUNTORES E CHAVES
Lançamento de Cabos de Força/Controle Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 5.000,00 (Falta: 5.000,00) M	10.0%	12/07/2026	20 d.u.	07/08/2026	20 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Energização e Operação Assistida Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	2.0%	26/07/2026	5 d.u.	31/07/2026	5 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

6. CONDIÇÕES OPERACIONAIS E RECURSOS (PADRÃO EPC)

HORÁRIO DE TRABALHO		HORAS TRABALHADAS	CONDIÇÃO CLIMÁTICA	TEMPO	CONDIÇÃO
ENTRADA / SAÍDA 07:00 - 17:00	INTERVALO 12:00 - 13:00	9h	Manhã	Ensolarado	Praticável
TEMPERATURA MÉDIA 35			Tarde	Ensolarado	Praticável

MÃO DE OBRA (30)					
PEDREIRO 10	CARPINTEIRO 2	SERVENTE 15	BETONEIRO 1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2	MÃO DE OBRA PRÓPRIA 30

EQUIPAMENTOS (3)		
MUNCK OPERANDO	RETRO ESCAVADEIRA OPERANDO	CAMINHÃO PARADO

INTERFERÊNCIAS / NOTAS
As dificuldades em obras fazem parte da realidade da construção civil e podem impactar diretamente o prazo, o custo e a qualidade dos serviços executados. Entre os principais desafios estão os atrasos na entrega de materiais, mudanças climáticas, falta de mão de obra qualificada, falhas no planejamento e dificuldades na comunicação entre as equipes.
Além disso, problemas com equipamentos, retrabalho e alterações de projeto durante a execução também contribuem para aumentar a complexidade da obra. Quando não há um acompanhamento eficiente, pequenas falhas podem gerar grandes prejuízos financeiros e atrasos no cronograma.
Outro ponto importante é a segurança dos trabalhadores. Obras exigem atenção constante às normas de segurança, treinamentos e fiscalização adequada para evitar acidentes e garantir um ambiente de trabalho mais seguro.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROGRESSO DO DIA



18 de abr. de 2026 15:40:50 BRT

18 de abr. de 2026 15:40:50 BRT

8°54'55,98"W

Local: FORTALEZA

Data: 18/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: Foto da obra

PROGRESSO DO DIA



19 de abr. de 2026 10:08:50 BRT

Local: FORTALEZA

Data: 18/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

FOTOS DA OBRA



19 de abr. de 2026 10:11:17 BRT

Local: FORTALEZA

Data: 18/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

LEGENDA

Critico — desvio negativo acima do limite configurado ou prazo esgotado

Em Alerta — desvio moderado, requer monitoramento

Ao Plano — dentro da meta prevista

Aguardando — bloqueado por dependência de outro serviço

Não Iniciado — aguardando mobilização

Concluído — progresso ≥ 99,9%

☐ Barra cinza = meta planejada | Barra colorida = executado acumulado

D. Rest. = dias úteis restantes · "× ritmo" = múltiplo de aceleração necessário para recuperar o atraso



RELATÓRIO Nº 44	DATA 19/05/2026
DIA DA SEMANA Terça-Feira	CONTRATO —
OBRA SE OBRA EXEMPLO	PRAZO CONTRATUAL 112 dias
LOCAL FORTALEZA	PRAZO DECORRIDO 44 dias
CONTRATANTE Não informado	RESPONSÁVEL Não informado
	PRAZO A VENCER 68 dias

PONTOS CRÍTICOS — 1 OCORRÊNCIA IDENTIFICADA

- Serviço 'Construção da Casa de Comando' CRÍTICO — Desvio de 17.5% excede limite de 10%


1. SUMÁRIO EXECUTIVO

PROGRESSO PLANEJADO (POND.) 22.15 % Meta acumulada até 19/05/2026	PROGRESSO EXECUTADO (POND.) 16.38 % Avanço físico acumulado	DESVIO DE PROGRESSO -5.77 % Executado – Planejado	SITUAÇÃO GERAL DA OBRA Atenção
--	--	--	--

2. CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

PLANEJADO		22.1%
EXECUTADO		16.4%

3. CURVA S — HISTÓRICO DE AVANÇO FÍSICO

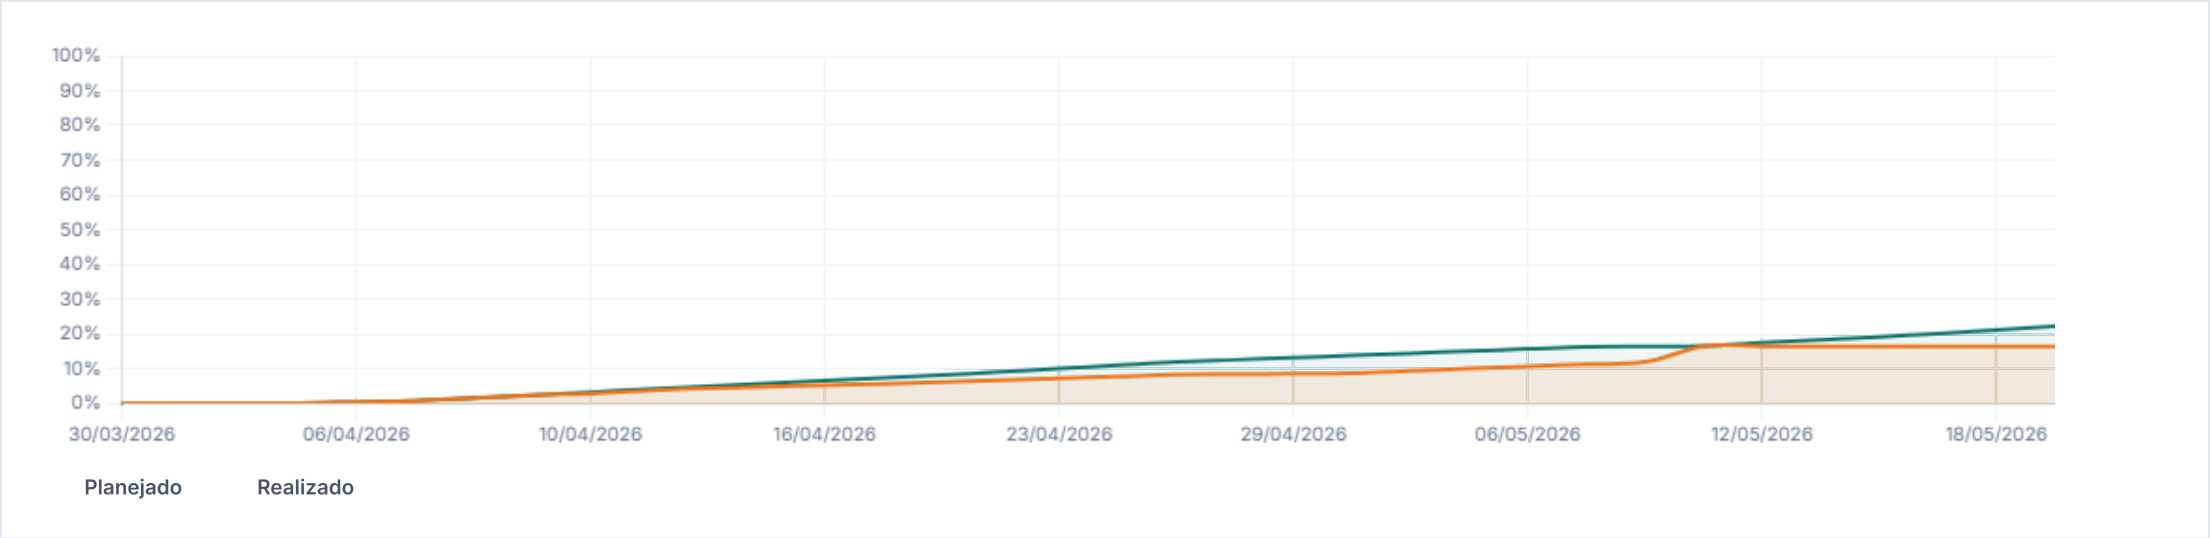

4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS POR STATUS

1 CRÍTICO	0 EM ALERTA	1 AO PLANO	3 NÃO INICIADO	6 AGUARDANDO	2 CONCLUÍDO
--------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------

5. DETALHAMENTO POR SERVIÇO

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Mobilização e Instalação do Canteiro Produção: 1,00 / 1,00 (Falta: 0,00) UN	5.0%	06/04/2026	15 d.u.	27/04/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO
Terraplenagem e Drenagem Restrição: Aguarda Mobilização e Instalação do Canteiro (100.0%) Produção: 5.000,00 / 5.000,00 (Falta: 0,00) M3	10.0%	08/04/2026	20 d.u.	07/05/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Construção da Casa de Comando Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 27,50 / 100,00 (Falta: 72,50) M2	5.0%	23/04/2026	40 d.u.	19/06/2026	22 d	45.00%	27.50%	-17.50%	CRÍTICO (Desvio -17.5% > Limite 10%) Previsão de término: 24/07/2026 (+26d úteis)
Montagem de Estruturas Metálicas Restrição: Aguarda Fundações (Pórticos e Equipamentos) (0.0%) Produção: 0,00 / 50,00 (Falta: 50,00) TON	15.0%	12/05/2026	20 d.u.	09/06/2026	14 d	30.00%	0.00%	-30.00%	AGUARDANDO: FUNDAÇÕES (PÓRTICOS E EQUIPAMENTOS)
Fundações (Pórticos e Equipamentos) Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 150,00 (Falta: 150,00) M3	5.0%	18/05/2026	25 d.u.	22/06/2026	23 d	8.00%	0.00%	-8.00%	AO PLANO
Montagem do Transformador de Força Restrição: Aguarda Malha de Aterramento (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) UN	10.0%	27/05/2026	10 d.u.	10/06/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MALHA DE ATERRAMENTO
Malha de Aterramento Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 2.000,00 (Falta: 2.000,00) M	10.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status	
Montagem de Disjuntores e Chaves Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 10,00 (Falta: 10,00) UN	5.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO	
Sistemas Auxiliares (Baterias/Painéis CC-CA) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) CJ	5.0%	22/06/2026	10 d.u.	03/07/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO	
Painéis de Proteção e Controle (SPCS) Restrição: Aguarda Construção da Casa de Comando (27.5%) Produção: 0,00 / 5,00 (Falta: 5,00) UN	10.0%	27/06/2026	15 d.u.	17/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO	
Comissionamento e Ensaios Restrição: Aguarda Montagem de Disjuntores e Chaves (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	8.0%	11/07/2026	15 d.u.	31/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE DISJUNTORES E CHAVES	
Lançamento de Cabos de Força/Controle Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 5.000,00 (Falta: 5.000,00) M	10.0%	12/07/2026	20 d.u.	07/08/2026	20 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Energização e Operação Assistida Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	2.0%	26/07/2026	5 d.u.	31/07/2026	5 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

6. CONDIÇÕES OPERACIONAIS E RECURSOS (PADRÃO EPC)

HORÁRIO DE TRABALHO		HORAS TRABALHADAS	CONDIÇÃO CLIMÁTICA	TEMPO	CONDIÇÃO
ENTRADA / SAÍDA 07:00 - 17:00	INTERVALO 12:00 - 13:00	9h	Manhã	Ensolarado	Praticável
TEMPERATURA MÉDIA 35			Tarde	Ensolarado	Praticável

MÃO DE OBRA (24)				
ENCARREGADO 4	SERVENTE 10	CARPINTEIRO 2	PEDREIRO 8	MÃO DE OBRA PRÓPRIA 24

EQUIPAMENTOS (4)			
MUNCK OPERANDO	ESCAVADEIRA OPERANDO	CAMINHÃO OPERANDO	GUINDASTE OPERANDO

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA OBRA



15 de abr. de 2026 09:03:11 BRT

Local: FORTALEZA
Data: 19/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

FOTOS DA OBRA



15 de abr. de 2026 16:04:32 BRT

Local: FORTALEZA
Data: 19/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

FOTOS DA OBRA



15 de abr. de 2026 16:05:22 BRT

Local: FORTALEZA
Data: 19/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

LEGENDA

Critico — desvio negativo acima do limite configurado ou prazo esgotado

Em Alerta — desvio moderado, requer monitoramento

Ao Plano — dentro da meta prevista

Aguardando — bloqueado por dependência de outro serviço

Não Iniciado — aguardando mobilização

Concluído — progresso ≥ 99,9%

☐ Barra cinza = meta planejada | Barra colorida = executado acumulado

D. Rest. = dias úteis restantes · "× ritmo" = múltiplo de aceleração necessário para recuperar o atraso



RELATÓRIO Nº 45	DATA 20/05/2026
DIA DA SEMANA Quarta-Feira	CONTRATO —
OBRA SE OBRA EXEMPLO	PRAZO CONTRATUAL 112 dias
LOCAL FORTALEZA	PRAZO DECORRIDO 45 dias
CONTRATANTE Não informado	RESPONSÁVEL Não informado
	PRAZO A VENCER 67 dias

PONTOS CRÍTICOS — 2 OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS

- Serviço 'Fundações (Pórticos e Equipamentos)' CRÍTICO — Desvio de 12.0% excede limite de 10%
- Serviço 'Construção da Casa de Comando' CRÍTICO — Desvio de 20.0% excede limite de 10%


1. SUMÁRIO EXECUTIVO

PROGRESSO PLANEJADO (POND.) 23.23 % Meta acumulada até 20/05/2026	PROGRESSO EXECUTADO (POND.) 16.38 % Avanço físico acumulado	DESVIO DE PROGRESSO -6.85 % Executado – Planejado	SITUAÇÃO GERAL DA OBRA Atenção
--	--	--	--

2. CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

PLANEJADO		23.2%
EXECUTADO		16.4%

3. CURVA S — HISTÓRICO DE AVANÇO FÍSICO

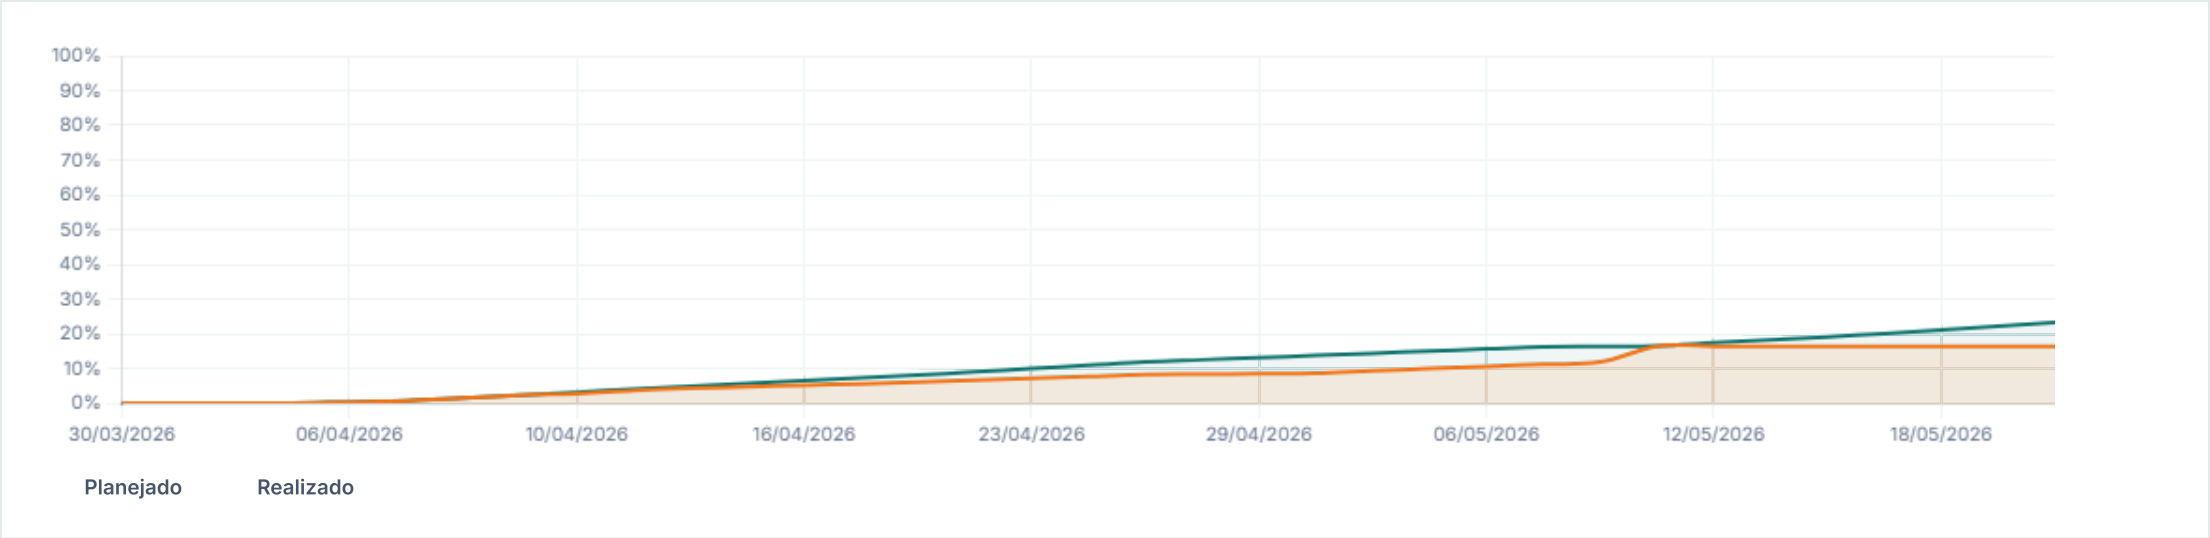

4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS POR STATUS

2 CRÍTICO	0 EM ALERTA	0 AO PLANO	3 NÃO INICIADO	6 AGUARDANDO	2 CONCLUÍDO
--------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------

5. DETALHAMENTO POR SERVIÇO

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Mobilização e Instalação do Canteiro Produção: 1,00 / 1,00 (Falta: 0,00) UN	5.0%	06/04/2026	15 d.u.	27/04/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO
Terraplenagem e Drenagem Restrição: Aguarda Mobilização e Instalação do Canteiro (100.0%) Produção: 5.000,00 / 5.000,00 (Falta: 0,00) M3	10.0%	08/04/2026	20 d.u.	07/05/2026	0 d	100.00%	100.00%	+0.00%	CONCLUÍDO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Construção da Casa de Comando Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 27,50 / 100,00 (Falta: 72,50) M2	5.0%	23/04/2026	40 d.u.	19/06/2026	21 d	47.50%	27.50%	-20.00%	CRÍTICO (Desvio -20.0% > Limite 10%) Previsão de término: 30/07/2026 (+30d úteis)
Montagem de Estruturas Metálicas Restrição: Aguarda Fundações (Pórticos e Equipamentos) (0.0%) Produção: 0,00 / 50,00 (Falta: 50,00) TON	15.0%	12/05/2026	20 d.u.	09/06/2026	13 d	35.00%	0.00%	-35.00%	AGUARDANDO: FUNDAÇÕES (PÓRTICOS E EQUIPAMENTOS)
Fundações (Pórticos e Equipamentos) Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 150,00 (Falta: 150,00) M3	5.0%	18/05/2026	25 d.u.	22/06/2026	22 d	12.00%	0.00%	-12.00%	CRÍTICO (Desvio -12.0% > Limite 10%)
Montagem do Transformador de Força Restrição: Aguarda Malha de Aterramento (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) UN	10.0%	27/05/2026	10 d.u.	10/06/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MALHA DE ATERRAMENTO
Malha de Aterramento Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 2.000,00 (Falta: 2.000,00) M	10.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO

Serviço / Atividade	Peso	Início	Prazo	Término Prev.	D. Rest.	Plan. Acum.	Exec. Acum.	Desvio	Status
Montagem de Disjuntores e Chaves Restrição: Aguarda Terraplenagem e Drenagem (100.0%) Produção: 0,00 / 10,00 (Falta: 10,00) UN	5.0%	02/06/2026	15 d.u.	23/06/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Sistemas Auxiliares (Baterias/Painéis CC-CA) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) CJ	5.0%	22/06/2026	10 d.u.	03/07/2026	10 d	0.00%	0.00%	+0.00%	NÃO INICIADO
Painéis de Proteção e Controle (SPCS) Restrição: Aguarda Construção da Casa de Comando (27.5%) Produção: 0,00 / 5,00 (Falta: 5,00) UN	10.0%	27/06/2026	15 d.u.	17/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
Comissionamento e Ensaios Restrição: Aguarda Montagem de Disjuntores e Chaves (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	8.0%	11/07/2026	15 d.u.	31/07/2026	15 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE DISJUNTORES E CHAVES
Lançamento de Cabos de Força/Controle Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 5.000,00 (Falta: 5.000,00) M	10.0%	12/07/2026	20 d.u.	07/08/2026	20 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SERVIÇO / ATIVIDADE	PESO	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO PREV.	D. REST.	PLAN. ACUM.	EXEC. ACUM.	DESVIO	STATUS
Energização e Operação Assistida Restrição: Aguarda Montagem de Estruturas Metálicas (0.0%) Produção: 0,00 / 1,00 (Falta: 1,00) VB	2.0%	26/07/2026	5 d.u.	31/07/2026	5 d	0.00%	0.00%	+0.00%	AGUARDANDO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

6. CONDIÇÕES OPERACIONAIS E RECURSOS (PADRÃO EPC)

HORÁRIO DE TRABALHO		HORAS TRABALHADAS	CONDIÇÃO CLIMÁTICA	TEMPO	CONDIÇÃO
ENTRADA / SAÍDA 07:00 - 17:00	INTERVALO 12:00 - 13:00	9h	Manhã	Ensolarado	Praticável
TEMPERATURA MÉDIA 35			Tarde	Ensolarado	Praticável

MÃO DE OBRA (27)			
PEDREIRO 10	CARPINTEIRO 2	SERVENTE 15	MÃO DE OBRA PRÓPRIA 27

EQUIPAMENTOS (4)			
MUNCK OPERANDO	ESCAVADEIRA OPERANDO	CAMINHÃO OPERANDO	GUINDASTE OPERANDO

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA OBRA



time is not synchronized
Local: FORTALEZA
Data: 20/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

FOTOS DA OBRA



time is not synchronized
Local: FORTALEZA
Data: 20/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

FOTOS DA OBRA



time is not synchronized
Local: FORTALEZA
Data: 20/05/2026

Engenharia LTDA

Legenda: exemplo

LEGENDA

Critico — desvio negativo acima do limite configurado ou prazo esgotado

Em Alerta — desvio moderado, requer monitoramento

Ao Plano — dentro da meta prevista

Aguardando — bloqueado por dependência de outro serviço

Não Iniciado — aguardando mobilização

Concluído — progresso ≥ 99,9%

☐ Barra cinza = meta planejada | Barra colorida = executado acumulado

D. Rest. = dias úteis restantes · "× ritmo" = múltiplo de aceleração necessário para recuperar o atraso
